

平成28年11月28日 全員協議会資料

担当課 教育総務部 学校給食課

新学校給食センター建設事業の進捗状況等について

1. 解体工事について

○進捗状況 : ①住民説明会終了後、8月半ば以降より工事にとりかかり、アスベストの撤去工事後、本格的な解体工事を開始し、順調に工事が進んでおります。

②現在は、建物基礎・土間関係の解体作業を進めているところで、年内には現場作業が終わる見込となっています。

2. 「新学校給食センター建設工事」について（別紙鳥瞰図、平面図参照）

○建設場所 : 富田林市藤沢台二丁目3番2号地内(第2給食センター跡地)

○建物規模 : 構造(鉄骨造 地上2階建)
敷地面積(6490.73㎡)
建築面積(3173.65㎡)
延べ床面積(3984.42㎡)

○予算規模 : 入札予定価格(2,021,880,000円)

○工事期間 : 契約の翌日より平成30年2月末日までを予定


○請負契約 : 12月8日仮契約予定
12月議会途中で追加提案を予定

○進捗状況 : ①現在、契約締結事務期間中となっています。

②契約締結後、1月中旬に住民説明会を開催する予定をいたしており、住民の皆様出来るだけご迷惑をかけないように工事を進めてまいりたいと考えております。

※添付資料

1. 新学校給食センター 鳥瞰図
2. 新学校給食センター建設工事 配置図
3. 新学校給食センター建設工事 1階平面図
4. 新学校給食センター建設工事 2階平面図

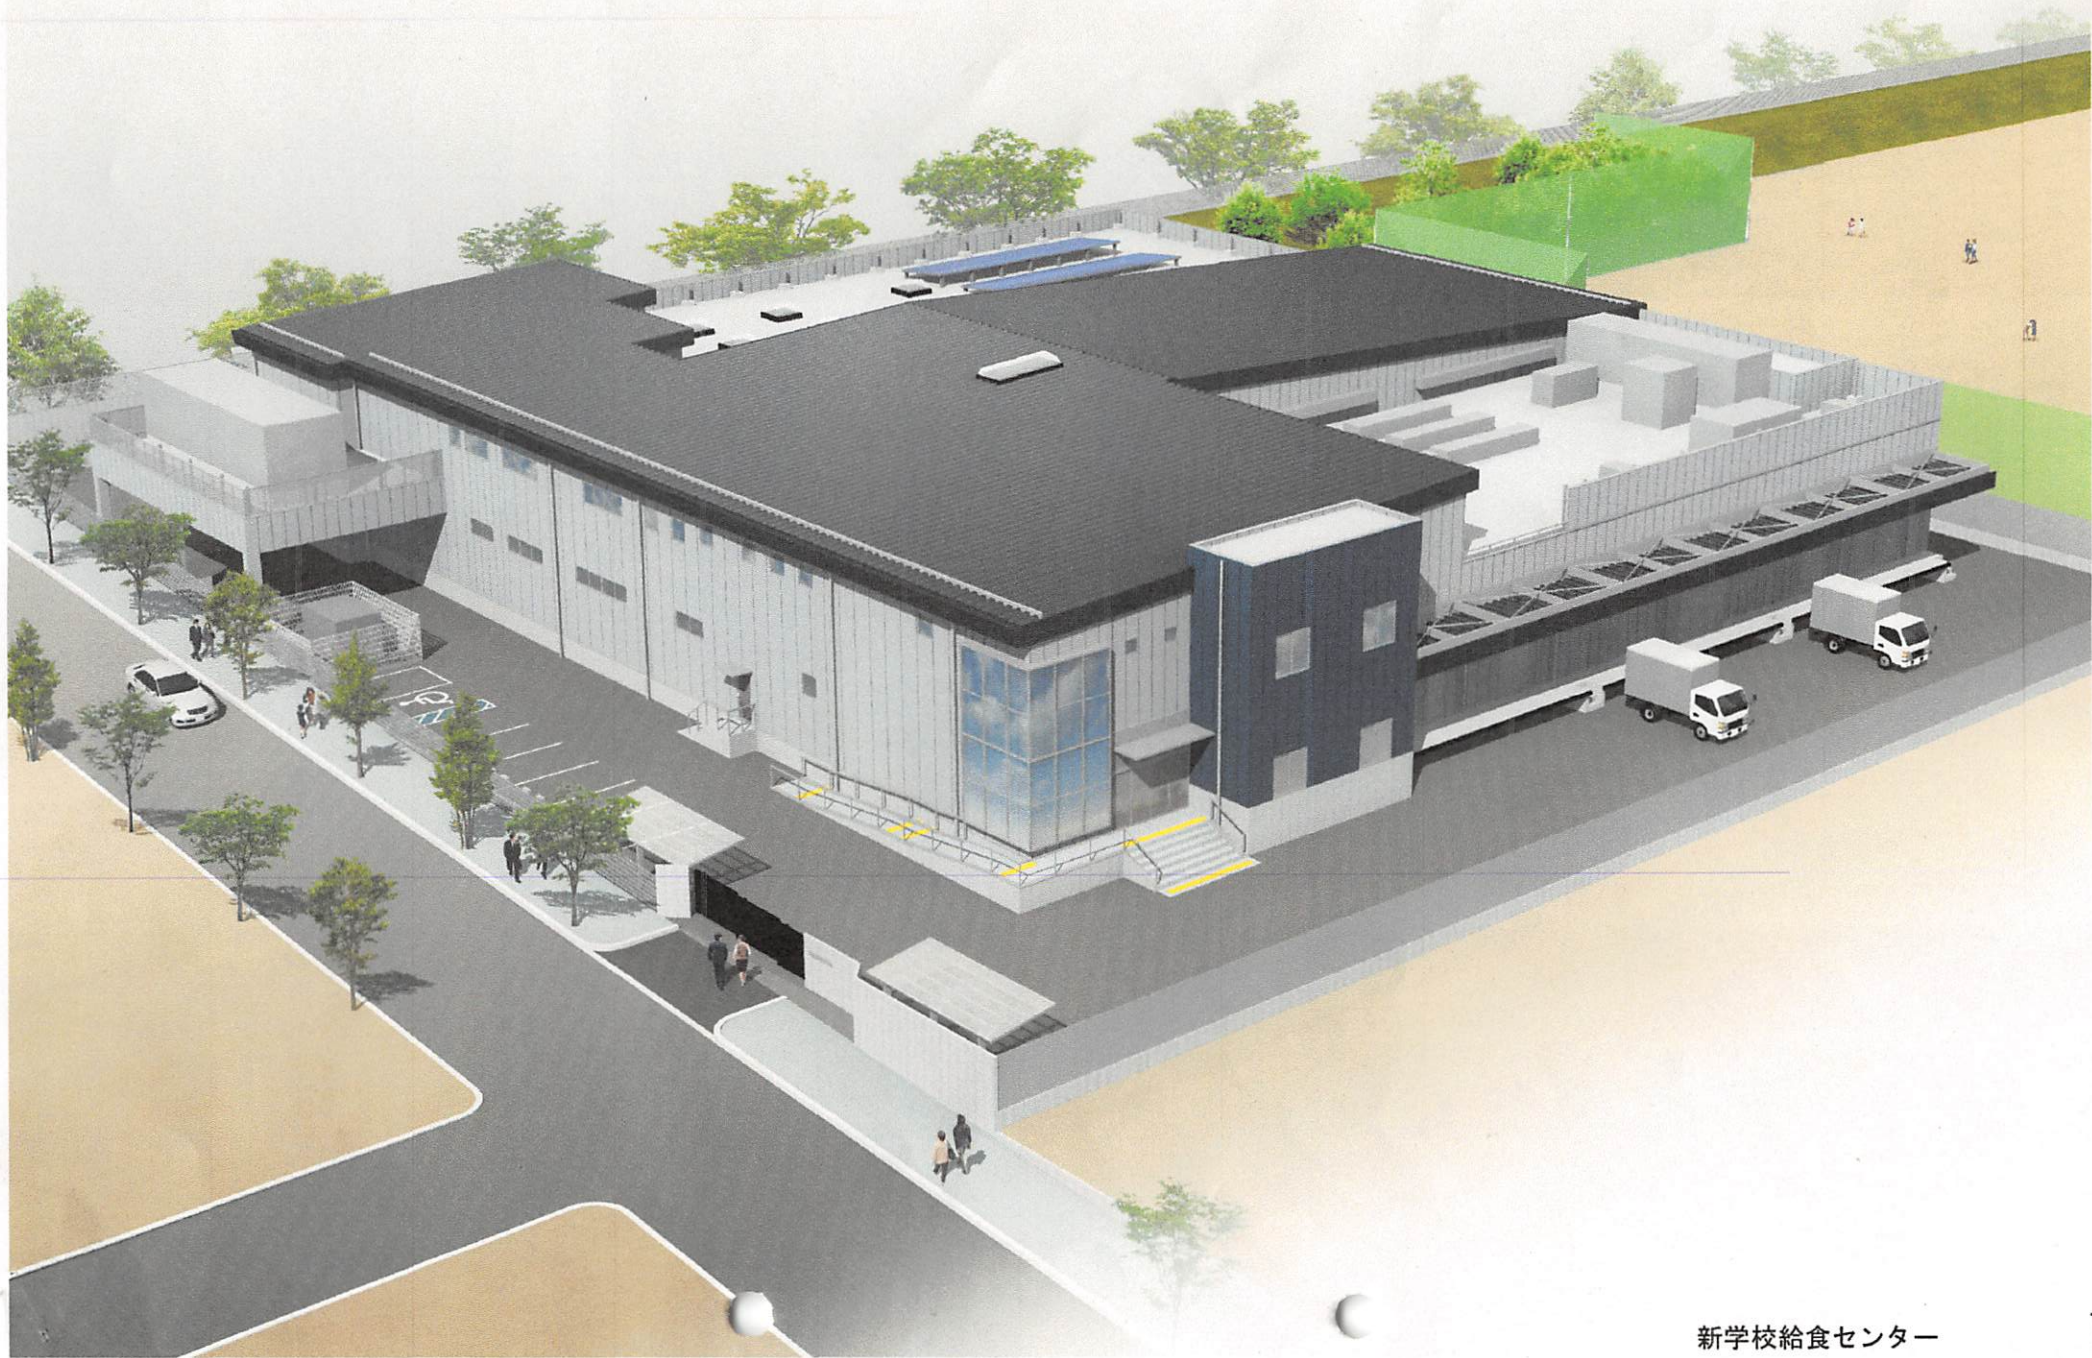


付近見取図

所在地
富田林市藤沢台二丁目5番(地名地番)
富田林市藤沢台二丁目3番2号地内(住居表示)



敷地面積	6 4 9 0 . 7 3 m ²
建築面積	3 1 7 3 . 8 5 m ²
延べ面積	3 9 8 4 . 4 2 m ²
構造	鉄骨造 地上2階建て


平成28年11月28日 全員協議会資料
学校給食課

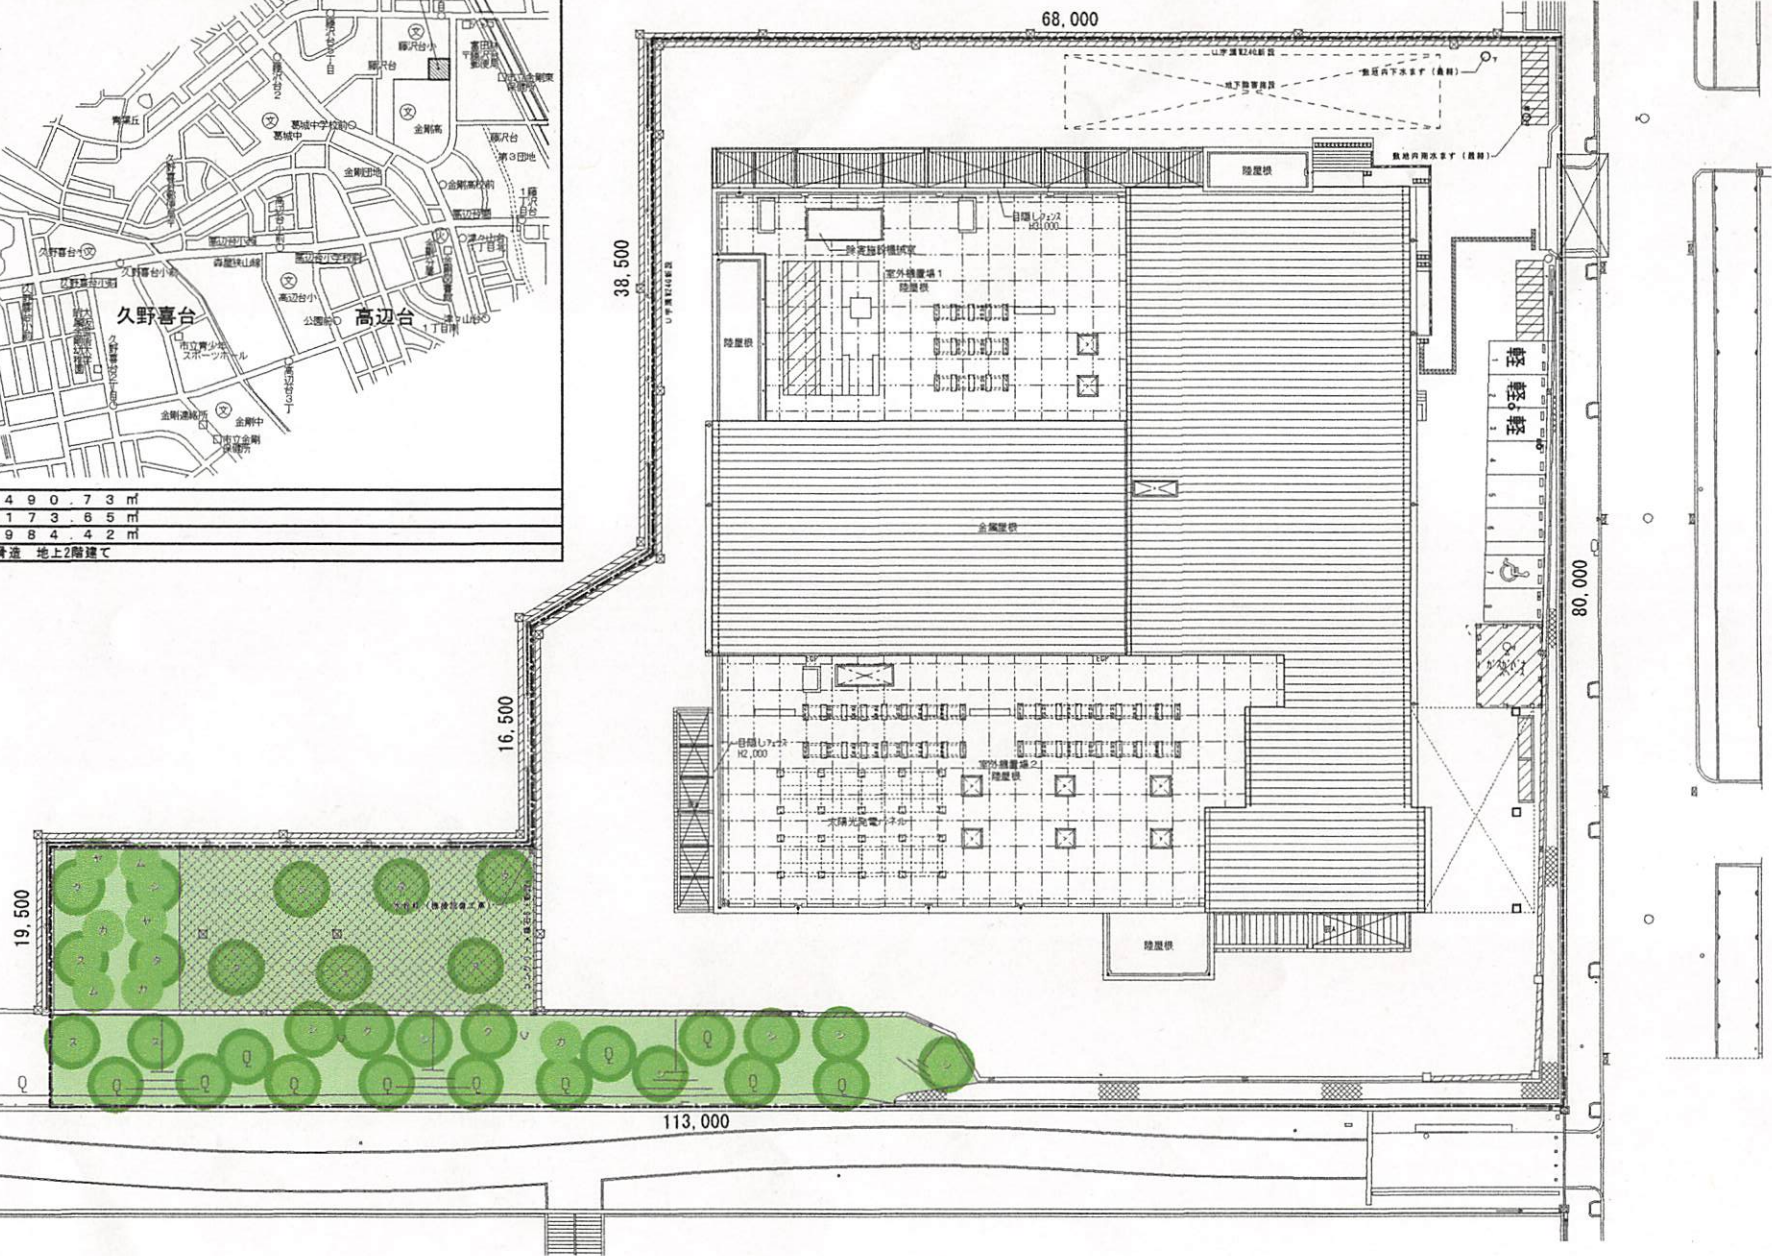



- 凡例
- 非汚染区域
 - 汚染区域
 - 前室・準備室
 - 事務室
 - 共有区域

炊飯室
 コソテナ室
 食器・食缶消毒保管
 コソテナ消毒保管

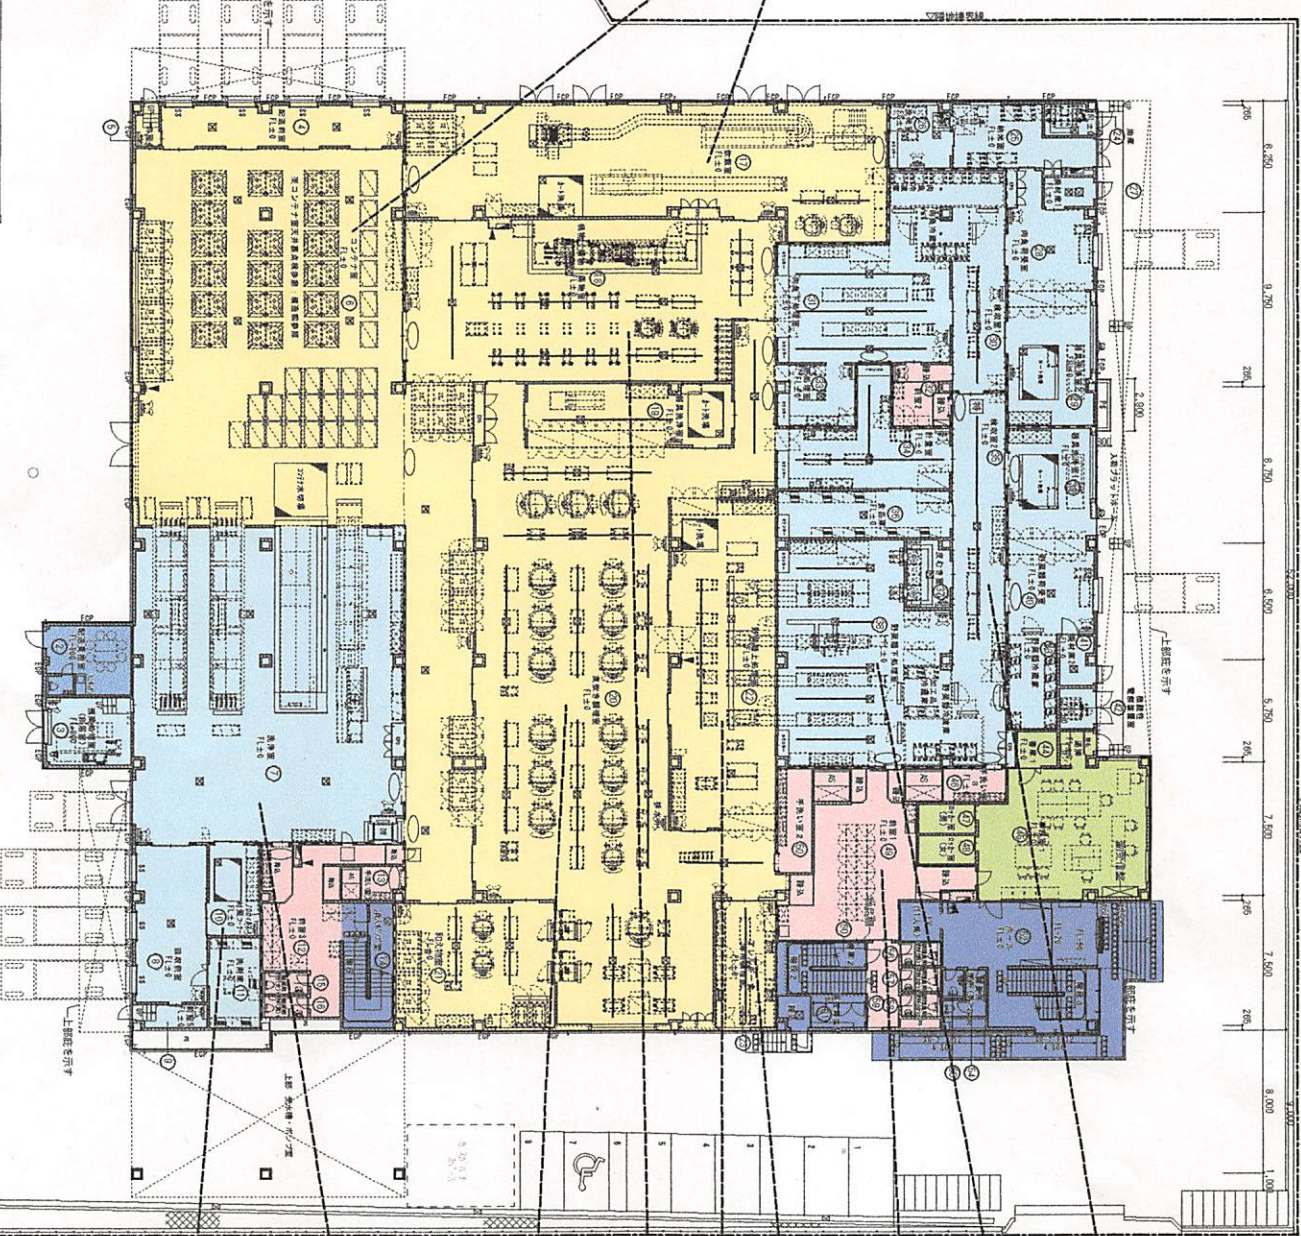

検収荷受室
 荷受・仕分け作業、
 廃棄物・肥料とし作業・運搬

肉魚・野菜下処理室

前室
 着替え、手洗い、荷受検収、
 下処理・非汚染作業エリア入退場

アレルギー食専用調理室

野菜上処理室

焼物・揚げ物・蒸物

煮炊き調理室
 煮物・汁物・炒め物・ポイル調理

洗浄室
 食器・食缶・コソテナ洗浄、
 テラレキ一用食器・食缶洗浄

ノロウイルス対策コーナー
 汚染食器・食缶洗浄消毒
 器具カート洗浄



凡例

- 調理関係者ゾーン
- 事務室
- 共有区域
- 機械室

